

TRIBUNA – GRADINATA, PRESSO AUDITORIUM DELLA STELLA PER FESTIVAL DEI DUE MONDI - SPOLETO

OGGETTO DELL'APPALTO


L'appalto ha per oggetto la fornitura della tribuna – gradinata presso L'Auditorium della Stella per il "Festival dei Due Mondi" a Spoleto. L'intervento prevede la fornitura del sistema modulare di "cavalle" ed "americane" in legno massiccio di abete, dei blocchi e della parete posteriore in multistrato.

L'oggetto dell'appalto è a corpo e comprende la fornitura di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente.

DESCRIZIONE GRADINATA

La struttura è di natura reversibile e potrà essere montata e smontata in funzione degli eventi previsti presso l'Auditorium.



La struttura sarà in materiale ligneo e dovrà accogliere 132 posti per gli spettatori e spazi di servizio.

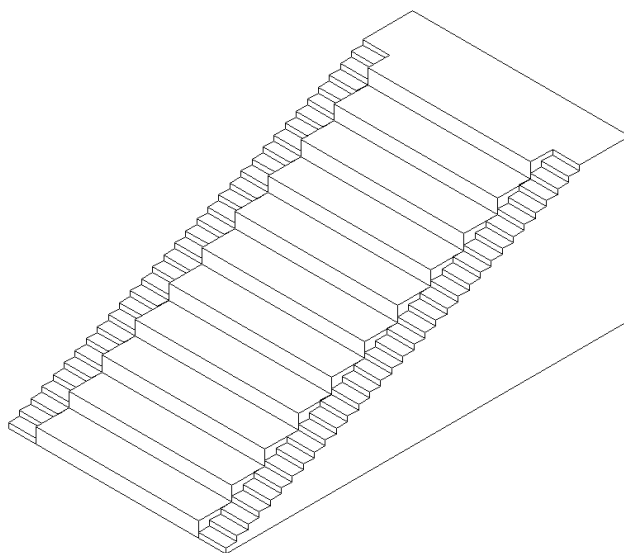

La gradinata, costruita in legno e opportunamente ignifugata, è costituita da componenti smontabili, removibile, si colloca nell'aula centrale dell'Auditorium Della Stella, sviluppandosi lungo l'asse longitudinale dell'edificio e occupando un'area rettangolare di 13,40 m x 7,20 m (totale di 96,48 mq),

ingombro che non compromette la libera circolazione perimetrale, garantita dal rispetto dei termini di larghezza minimi consentiti dalla normativa vigente. La gradinata, orientata parallela alle murature longitudinali dell'edificio, parte da un'altezza minima di circa 50 cm (fronte - palco) per raggiungere una quota massima di circa 5,30 m in prossimità della bussola d'ingresso.

La configurazione strutturale della gradinata prevede la predisposizione di due file longitudinali da 33 gradini ciascuna, collocate simmetricamente, che garantiscono l'accesso del pubblico alle sedute. La parte centrale, composta da 12 file di gradoni da 48 cm di altezza, per 110 cm di profondità, è destinata alle postazioni degli spettatori. L'aspetto complessivo offre la disponibilità di 132 posti a sedere totali e di un'area tecnica.

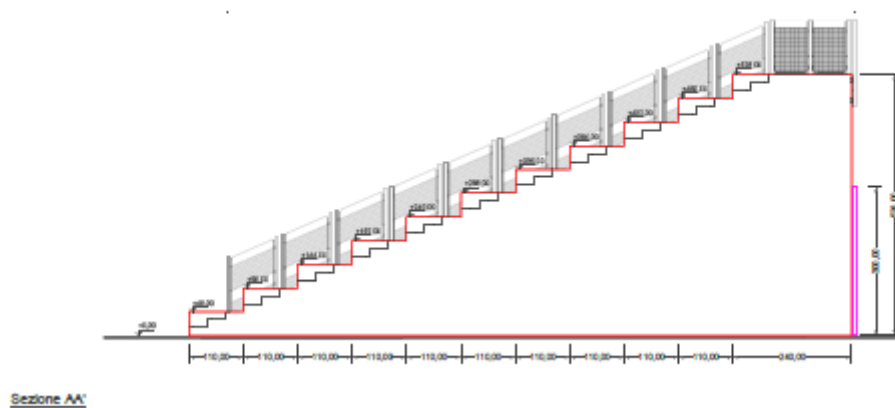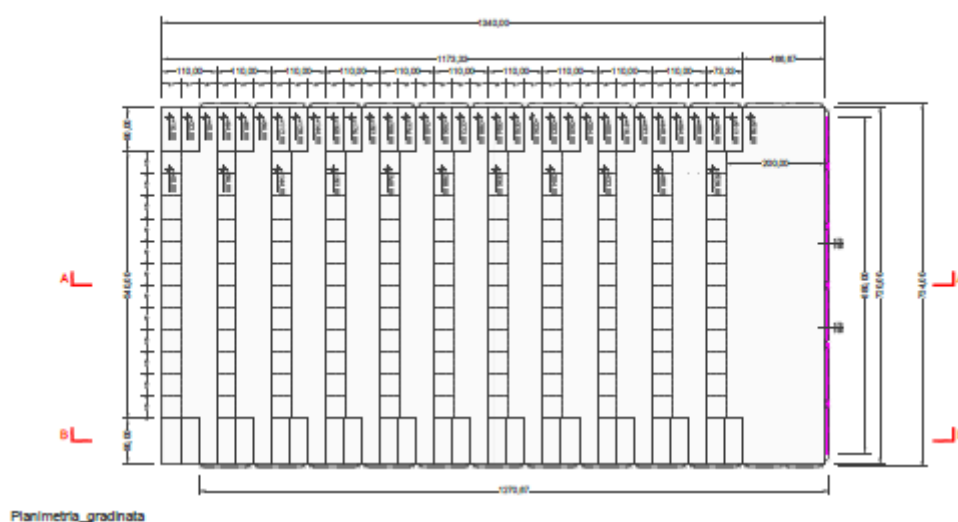

La struttura della tribuna verrà realizzato con il sistema modulare di “cavalle” ed “americane” poste a sostegno del sovrastante tavolato. Il piano di calpestio (tavolato) è in pannelli di legno multistrato mentre il sistema modulare di “cavalle” ed “americane” è in legno massiccio di abete.

I locali di servizio sono posti sul retro della scalinata con accesso tramite ante scorrevoli su binario.

OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente fornitura è relativa al sistema modulare di “cavalle” ed “americane” in legno massiccio di abete, dei blocchi e della parete posteriore in multistrato. Le quantità e caratteristiche tecniche sono indicate negli allegati grafici del presente capitolato.

COMPUTO METRICO

<i>Componente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Dimensioni lineari (mm)</i>	<i>Area (mq)</i>	<i>Qtà</i>	<i>Prezzo unitario (euro)</i>	<i>Totale (euro)</i>
Cavalle	Cavalle in legno di abete		36,86	9		
Americane	Americane in legno di abete	7200 x 4800 h	34,56	1		
	Americane in legno di abete	7200 x 3840 h	27,65	1		
	Americane in legno di abete	7200 x 2880 h	20,74	1		
	Americane in legno di abete	7200 x 1920 h	13,84	1		
	Americane in legno di abete	7200 x 960 h	6,91	1		
Blocchi	Pareti laterali in multistrato		1,58	5		
	Piani di calpestio in multistrato		3,96	4		
	Piani alzate in multistrato		1,73	4		
Parete posteriore e Sportelli	Ante scorrevoli su binario in multistrato con telaio in legno massiccio	2000 x 3000 h	6	2		
	Binario	8000		1		
	Parete prospetto posteriore in multistrato con telaio in legno massiccio	7200 x 5280 h	38	1		
TOTALE LOTTO 1						
